
ชื่อ นายพิชัยยุทธ์ แกล้วทนงค์ รหัสนักศึกษา 6211428015


ใบงานบทที่ 5 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. กิจกรรมต่างๆสิ่งที่ต้องทำ และความสัมพันธ์ของกิจกรรม มีดังนี้

กิจกรรม	กิจกรรมที่ทำก่อน	ระยะเวลา(วัน)
A		10
В		3
С	А	10
D	В	5
E	C,D	4
F	E	20

- 1. เขียนแบบโครงข่ายงาน
- 2. หากิจกรรมวิกฤต สายงานวิกฤต และระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการ
- 3. เวลายืดหยุ่นต่างๆ ของแต่ละกิจกรรม

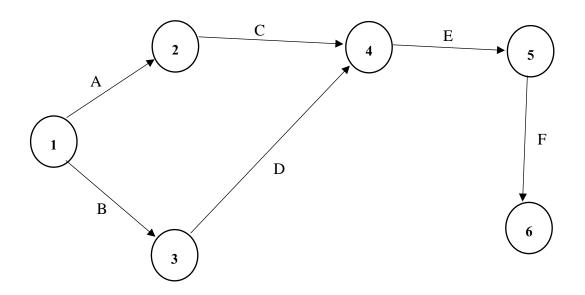

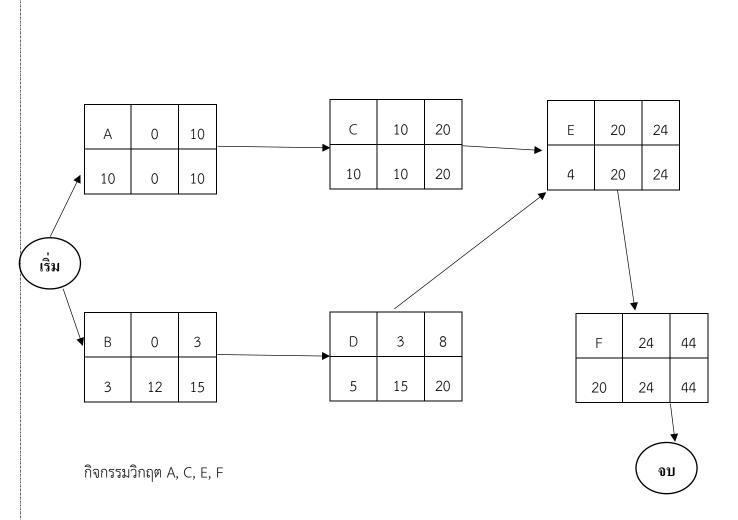



TE A=0 B=12 C=0 D=12 E=0 F=0

2. กิจกรรมต่างๆสิ่งที่ต้องทำ และความสัมพันธ์ของกิจกรรม มีดังนี้

กิจกรรม	กิจกรรมที่ทำก่อน	ระยะเวลา(วัน)
A		2
В		3
С	А	2
D	В	4
E	С	4
F	С	3
G	D,E	5
Н	F,G	2

- 1. เขียนแบบโครงข่ายงาน
- 2. หากิจกรรมวิกฤต สายงานวิกฤต และระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการ
- 3. เวลายืดหยุ่นต่างๆ ของแต่ละกิจกรรม

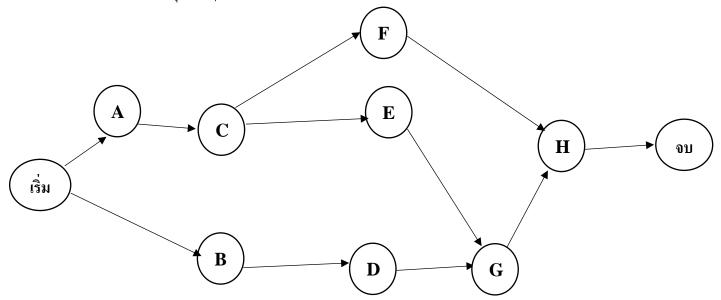

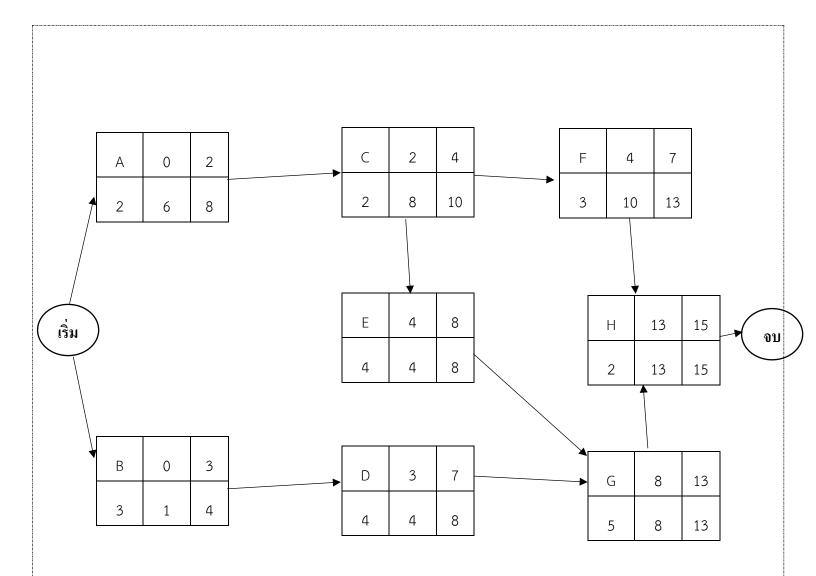


กิจกรรมวิกฤต E, G, H


TE A=6 B=1 C=6 D=1 E=0 F=6 G=0 H=0

3. กิจกรรมต่างๆสิ่งที่ต้องทำ และความสัมพันธ์ของกิจกรรม มีดังนี้

กิจกรรม	กิจกรรมที่ทำก่อน	ระยะเวลา(วัน)
А		2
В	А	3
С	А	5
D	В	4
E	В	1
F	С	6
G	С	2
Н	D	8
l	E,F	7
J	G	4

- 1. เขียนแบบโครงข่ายงาน
- 2. หากิจกรรมวิกฤต สายงานวิกฤต และระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการ
- 3. เวลายืดหยุ่นต่างๆ ของแต่ละกิจกรรม

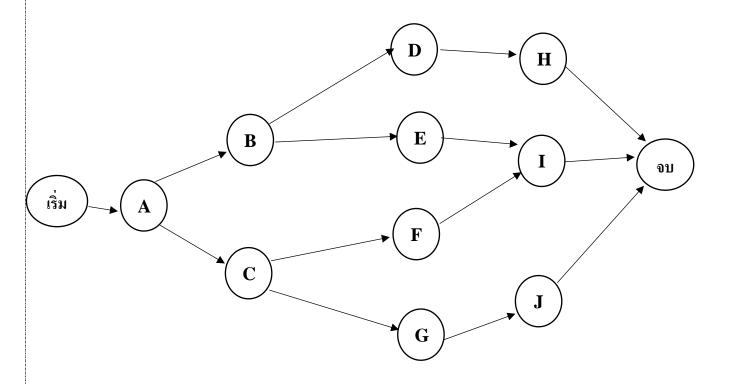

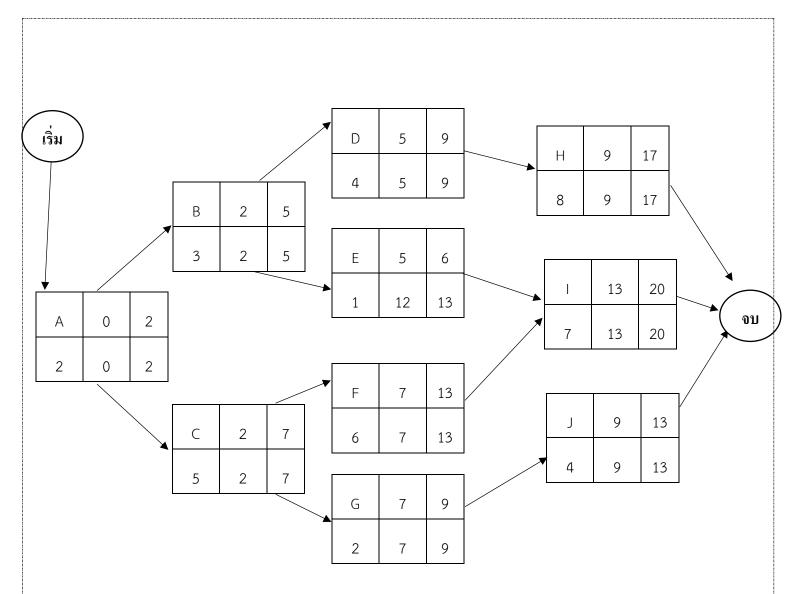


กิจกรรมวิกฤต A, B, C, D, F, G, H, I, J


TE A=0 B=0 C=0 D=0 E=7 F=0 G=0 H=0 I=0 J=0

4. กิจกรรมต่างๆสิ่งที่ต้องทำ และความสัมพันธ์ของกิจกรรม มีดังนี้

กิจกรรม	กิจกรรมที่ทำก่อน	ระยะเวลา(วัน)
А	-	6
В	А	4
С	В	7
D	А	2
E	D	4
F	Е	10
G	-	2
Н	G	10
I	H,J	6
J	-	13
K	А	9
L	C,K	3
M	I,L	5

- 1. เขียนแบบโครงข่ายงาน
- 2. หากิจกรรมวิกฤต สายงานวิกฤต และระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการ
- 3. เวลายืดหยุ่นต่างๆ ของแต่ละกิจกรรม

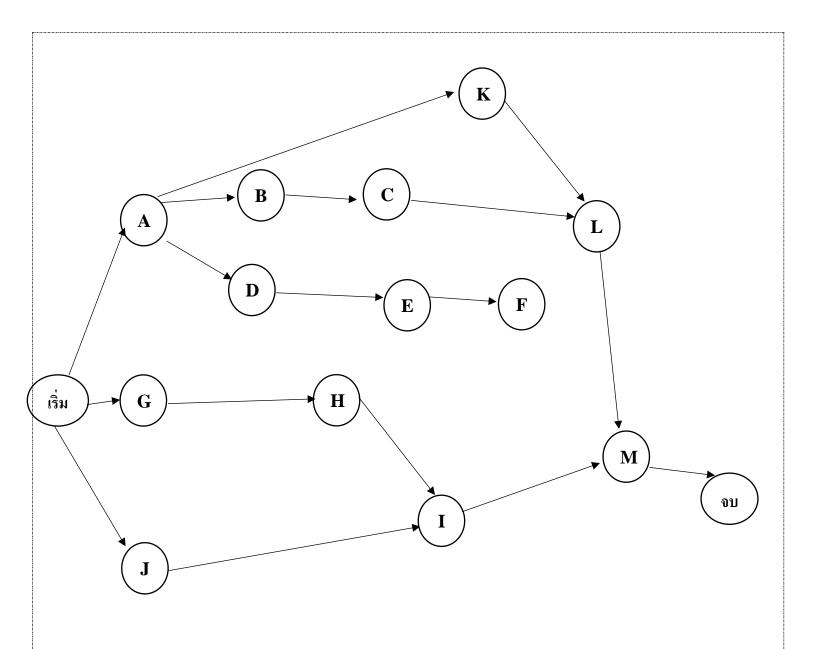

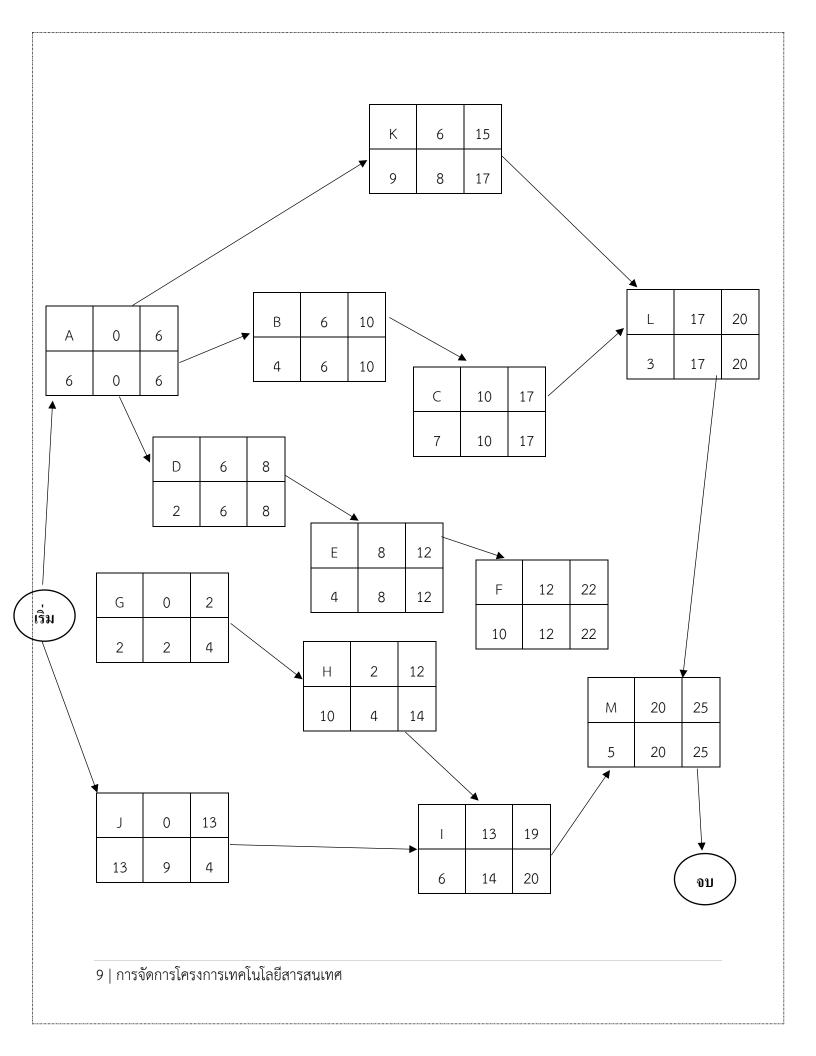

TE A=0 B=0 C=0 D=0 E=0 F=0 G=2 H=2 I=1 J=9 K=2 L=0 M=0					
